

# Prilog - peti slučaj

---

**Butorac, Lovro**

**Supplement / Prilog**

*Publication year / Godina izdavanja:* **2023**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:190:889398>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-07-11**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering](#)



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Work	Resources	Jul '23							Aug '23					Sep '23			Oct '23		
									11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	
1	<b>OPREMANJE 2. PLATFORME STROJARNICE</b>	<b>59 days</b>	<b>Thu 6.7.23</b>	<b>Tue 26.9.23</b>		<b>\$148.928,00</b>	<b>4.588 hrs</b>		<b>OPREMANJE 2. PLATFORME STROJARNICE</b>																	
2	<b>Montaža temelja</b>	<b>14,25 days</b>	<b>Thu 6.7.23</b>	<b>Wed 26.7.23</b>		<b>\$8.880,00</b>	<b>444 hrs</b>		<b>Montaža temelja</b>																	
3	Montaža temelja 445-003	0,75 days	Thu 6.7.23	Thu 6.7.23		\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 445-003 B1																	
4	Montaža temelja 445-004	0,75 days	Thu 6.7.23	Thu 6.7.23		\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 445-004 B2																	
5	Montaža temelja 452-001	0,75 days	Thu 6.7.23	Fri 7.7.23	3	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 452-001 B1																	
6	Montaža temelja 452-005	0,75 days	Thu 6.7.23	Fri 7.7.23	4	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 452-005 B2																	
7	Montaža temelja 581-001	0,75 days	Fri 7.7.23	Mon 10.7.23	5	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 581-001 B1																	
8	Montaža temelja 581-002	0,75 days	Fri 7.7.23	Mon 10.7.23	6	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 581-002 B2																	
9	Montaža temelja 581-003	0,75 days	Mon 10.7.23	Mon 10.7.23	7	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 581-003 B1																	
10	Montaža temelja 582-001	0,75 days	Mon 10.7.23	Mon 10.7.23	8	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 582-001 B2																	
11	Montaža temelja 582-003/01	0,75 days	Tue 11.7.23	Tue 11.7.23	9	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 582-003/01 B1																	
12	Montaža temelja 582-003/02	0,75 days	Tue 11.7.23	Tue 11.7.23	10	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 582-003/02 B2																	
13	Montaža temelja 644-008/01	0,75 days	Tue 11.7.23	Wed 12.7.23	11	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 644-008/01 B1																	
14	Montaža temelja 644-008/02	0,75 days	Tue 11.7.23	Wed 12.7.23	12	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 644-008/02 B2																	
15	Montaža temelja 651-001	0,75 days	Wed 12.7.23	Thu 13.7.23	13	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 651-001 B1																	
16	Montaža temelja 651-002	0,75 days	Wed 12.7.23	Thu 13.7.23	14	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 651-002 B2																	
17	Montaža temelja 651-003	0,75 days	Thu 13.7.23	Thu 13.7.23	15	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 651-003 B1																	
18	Montaža temelja 702-001	0,75 days	Thu 13.7.23	Thu 13.7.23	16	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 702-001 B2																	
19	Montaža temelja 702-004	0,75 days	Fri 14.7.23	Fri 14.7.23	17	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 702-004 B1																	
20	Montaža temelja 702-005	0,75 days	Fri 14.7.23	Fri 14.7.23	18	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 702-005 B2																	
21	Montaža temelja 703-001	0,75 days	Fri 14.7.23	Mon 17.7.23	19	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 703-001 B1																	
22	Montaža temelja 703-002	0,75 days	Fri 14.7.23	Mon 17.7.23	20	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 703-002 B2																	
23	Montaža temelja 712-001	0,75 days	Mon 17.7.23	Tue 18.7.23	21	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 712-001 B1																	
24	Montaža temelja 713-007	0,75 days	Mon 17.7.23	Tue 18.7.23	22	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 713-007 B2																	
25	Montaža temelja 714-001	0,75 days	Tue 18.7.23	Tue 18.7.23	23	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 714-001 B1																	
26	Montaža temelja 756-001/02	0,75 days	Tue 18.7.23	Tue 18.7.23	24	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 756-001/02 B2																	
27	Montaža temelja 722-011	0,75 days	Wed 19.7.23	Wed 19.7.23	25	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 722-011 B1																	
28	Montaža temelja 731-001/01	0,75 days	Wed 19.7.23	Wed 19.7.23	26	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 731-001/01 B2																	
29	Montaža temelja 731-001/02	0,75 days	Wed 19.7.23	Thu 20.7.23	27	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 731-001/02 B1																	
30	Montaža temelja 731-002	0,75 days	Wed 19.7.23	Thu 20.7.23	28	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 731-002 B2																	
31	Montaža temelja 731-003/01	0,75 days	Thu 20.7.23	Fri 21.7.23	29	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 731-003/01 B1																	

Project: OPREMANJE 2 PLATFORME  
Date: Thu 7.9.23


Critical		Split		Slack		Project Summary		External Tasks	
Critical Split		Progress		Slippage		Rolled Up Critical		External Milestone	
Task		Milestone		Summary		Rolled Up Critical		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Work	Resources	Jul '23					Aug '23					Sep '23			Oct '23				
									11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	
32	Montaža temelja 731-003/01	0,75 days	Thu 20.7.23	Fri 21.7.23	30	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 731-003/01 B2																	
33	Montaža temelja 733-001	0,75 days	Fri 21.7.23	Fri 21.7.23	31	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 733-001 B1																	
34	Montaža temelja 733-012	0,75 days	Fri 21.7.23	Fri 21.7.23	32	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 733-012 B2																	
35	Montaža temelja 734-001	0,75 days	Mon 24.7.23	Mon 24.7.23	33	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 734-001 B1																	
36	Montaža temelja 743-002	0,75 days	Mon 24.7.23	Mon 24.7.23	34	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 743-002 B2																	
37	Montaža temelja 743-003	0,75 days	Mon 24.7.23	Tue 25.7.23	35	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 743-003 B1																	
38	Montaža temelja 751-001	0,75 days	Mon 24.7.23	Tue 25.7.23	36	\$240,00	12 hrs	Bravari2 (2)[200%]	Montaža temelja 751-001 B0,75 days																	
39	Montaža temelja 756-004	0,75 days	Tue 25.7.23	Wed 26.7.23	37	\$240,00	12 hrs	Bravari1 (2)[200%]	Montaža temelja 756-004 B1																	
40	<b>Montaža strojeva I uređaja</b>	<b>9,5 days</b>	<b>Mon 17.7.23</b>	<b>Fri 28.7.23</b>	<b>2FS-7 days</b>	<b>\$7.104,00</b>	<b>296 hrs</b>		<b>Montaža strojeva I uređaja</b>																	
41	Montaža 445-003	0,5 days	Mon 17.7.23	Mon 17.7.23		\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 445-003 M1																	
42	Montaža 445-004	0,5 days	Mon 17.7.23	Mon 17.7.23		\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 445-004 M2																	
43	Montaža 452-001	0,5 days	Mon 17.7.23	Tue 18.7.23	41	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 452-001 M1																	
44	Montaža 452-005	0,5 days	Mon 17.7.23	Tue 18.7.23	42	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 452-005 M2																	
45	Montaža 581-001	0,5 days	Tue 18.7.23	Tue 18.7.23	43	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 581-001 M1																	
46	Montaža 581-002	0,5 days	Tue 18.7.23	Tue 18.7.23	44	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 581-002 M2																	
47	Montaža 581-003	0,5 days	Tue 18.7.23	Wed 19.7.23	45	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 581-003 M1																	
48	Montaža 582-001	0,5 days	Tue 18.7.23	Wed 19.7.23	46	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 582-001 M2																	
49	Montaža 582-003/01	0,5 days	Wed 19.7.23	Wed 19.7.23	47	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 582-003/01 M1																	
50	Montaža 582-003/02	0,5 days	Wed 19.7.23	Wed 19.7.23	48	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 582-003/02 M2																	
51	Montaža 644-008/01	0,5 days	Wed 19.7.23	Thu 20.7.23	49	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 644-008/01 M1																	
52	Montaža 644-008/02	0,5 days	Wed 19.7.23	Thu 20.7.23	50	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 644-008/02 M2																	
53	Montaža 651-001	0,5 days	Thu 20.7.23	Thu 20.7.23	51	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 651-001 M1																	
54	Montaža 651-002	0,5 days	Thu 20.7.23	Thu 20.7.23	52	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 651-002 M2																	
55	Montaža 651-003	0,5 days	Thu 20.7.23	Fri 21.7.23	53	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 651-003 M1																	
56	Montaža 702-001	0,5 days	Thu 20.7.23	Fri 21.7.23	54	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 702-001 M2																	
57	Montaža 702-004	0,5 days	Fri 21.7.23	Fri 21.7.23	55	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 702-004 M1																	
58	Montaža 702-005	0,5 days	Fri 21.7.23	Fri 21.7.23	56	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 702-005 M2																	
59	Montaža 703-001	0,5 days	Fri 21.7.23	Mon 24.7.23	57	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 703-001 M1																	
60	Montaža 703-002	0,5 days	Fri 21.7.23	Mon 24.7.23	58	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 703-002 M2																	
61	Montaža 712-001	0,5 days	Mon 24.7.23	Mon 24.7.23	59	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]	Montaža 712-001 M1																	
62	Montaža 713-007	0,5 days	Mon 24.7.23	Mon 24.7.23	60	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]	Montaža 713-007 M2																	

Project: OPREMANJE 2 PLATFORME  
Date: Thu 7.9.23

Critical		Split		Slack		Project Summary		External Tasks	
Critical Split		Progress		Slippage		Rolled Up Critical		External Milestone	
Task		Milestone		Summary		Rolled Up Critical		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Work	Resources	Jul '23				Aug '23				Sep '23				Oct '23				
									11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1
63	Montaža 714-001	0,5 days	Mon 24.7.23	Tue 25.7.23	61	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
64	Montaža 756-001/02	0,5 days	Mon 24.7.23	Tue 25.7.23	62	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
65	Montaža 722-011	0,5 days	Tue 25.7.23	Tue 25.7.23	63	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
66	Montaža 731-001/01	0,5 days	Tue 25.7.23	Tue 25.7.23	64	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
67	Montaža 731-001/02	0,5 days	Tue 25.7.23	Wed 26.7.23	65	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
68	Montaža 731-002	0,5 days	Tue 25.7.23	Wed 26.7.23	66	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
69	Montaža 731-003/01	0,5 days	Wed 26.7.23	Wed 26.7.23	67	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
70	Montaža 731-003/01	0,5 days	Wed 26.7.23	Wed 26.7.23	68	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
71	Montaža 733-001	0,5 days	Wed 26.7.23	Thu 27.7.23	69	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
72	Montaža 733-012	0,5 days	Wed 26.7.23	Thu 27.7.23	70	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
73	Montaža 734-001	0,5 days	Thu 27.7.23	Thu 27.7.23	71	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
74	Montaža 743-002	0,5 days	Thu 27.7.23	Thu 27.7.23	72	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
75	Montaža 743-003	0,5 days	Thu 27.7.23	Fri 28.7.23	73	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
76	Montaža 751-001	0,5 days	Thu 27.7.23	Fri 28.7.23	74	\$192,00	8 hrs	Mehaničari2 (2)[200%]																	
77	Montaža 756-004	0,5 days	Fri 28.7.23	Fri 28.7.23	75	\$192,00	8 hrs	Mehaničari1 (2)[200%]																	
78	<b>Cjevarski radovi</b>	<b>20,25 days</b>	<b>Wed 19.7.23</b>	<b>Wed 16.8.23</b>	<b>40FS-7 days</b>	<b>\$39.072,00</b>	<b>888 hrs</b>																		
79	Montaža prolaza	5,25 days	Wed 19.7.23	Wed 26.7.23		\$7.392,00	168 hrs	Cjevari1 (4)[400%]																	
80	Montaža nosača	7,5 days	Thu 20.7.23	Mon 31.7.23	79FS-5 days	\$10.560,00	240 hrs	Cjevari2 (4)[400%]																	
81	Montaža cijevi	15 days	Thu 27.7.23	Wed 16.8.23	79	\$21.120,00	480 hrs	Cjevari1 (4)[400%]																	
82	<b>Bravarski radovi</b>	<b>17,5 days</b>	<b>Wed 26.7.23</b>	<b>Fri 18.8.23</b>	<b>78FS-16 days</b>	<b>\$8.480,00</b>	<b>424 hrs</b>																		
83	Montaža podnica	10,5 days	Wed 26.7.23	Wed 9.8.23		\$3.360,00	168 hrs	Bravari2 (2)[200%]																	
84	Montaža ljestvi	9 days	Thu 27.7.23	Wed 9.8.23	37FS+2 days	\$2.880,00	144 hrs	Bravari1 (2)[200%]																	
85	Montaža skala	7 days	Wed 9.8.23	Fri 18.8.23	83	\$2.240,00	112 hrs	Bravari2 (2)[200%]																	
86	<b>Električarski radovi</b>	<b>24 days</b>	<b>Mon 31.7.23</b>	<b>Fri 1.9.23</b>	<b>80</b>	<b>\$54.144,00</b>	<b>1.128 hrs</b>																		
87	Montaža kablskih prolaza	5,25 days	Mon 31.7.23	Mon 7.8.23		\$8.064,00	168 hrs	Električari1 (4)[400%]																	
88	Montaža kablskih staza	11,25 days	Mon 7.8.23	Tue 22.8.23	87	\$17.280,00	360 hrs	Električari1 (4)[400%]																	
89	Provlačenje kabela	18,75 days	Mon 7.8.23	Fri 1.9.23	87	\$28.800,00	600 hrs	Električari2 (4)[400%]																	
90	<b>Limarski radovi</b>	<b>15 days</b>	<b>Thu 31.8.23</b>	<b>Wed 20.9.23</b>	<b>78FS+10 days</b>	<b>\$8.160,00</b>	<b>408 hrs</b>																		
91	Montaža ventilacijskih prolaza	7 days	Thu 31.8.23	Fri 8.9.23		\$2.240,00	112 hrs	Limari2 (2)[200%]																	
92	Montaža ventilacijskih kanala	15 days	Thu 31.8.23	Wed 20.9.23		\$4.800,00	240 hrs	Limari1 (2)[200%]																	
93	Montaža zaštite strojeva I uređaja	3,5 days	Mon 11.9.23	Thu 14.9.23	91	\$1.120,00	56 hrs	Limari2 (2)[200%]																	

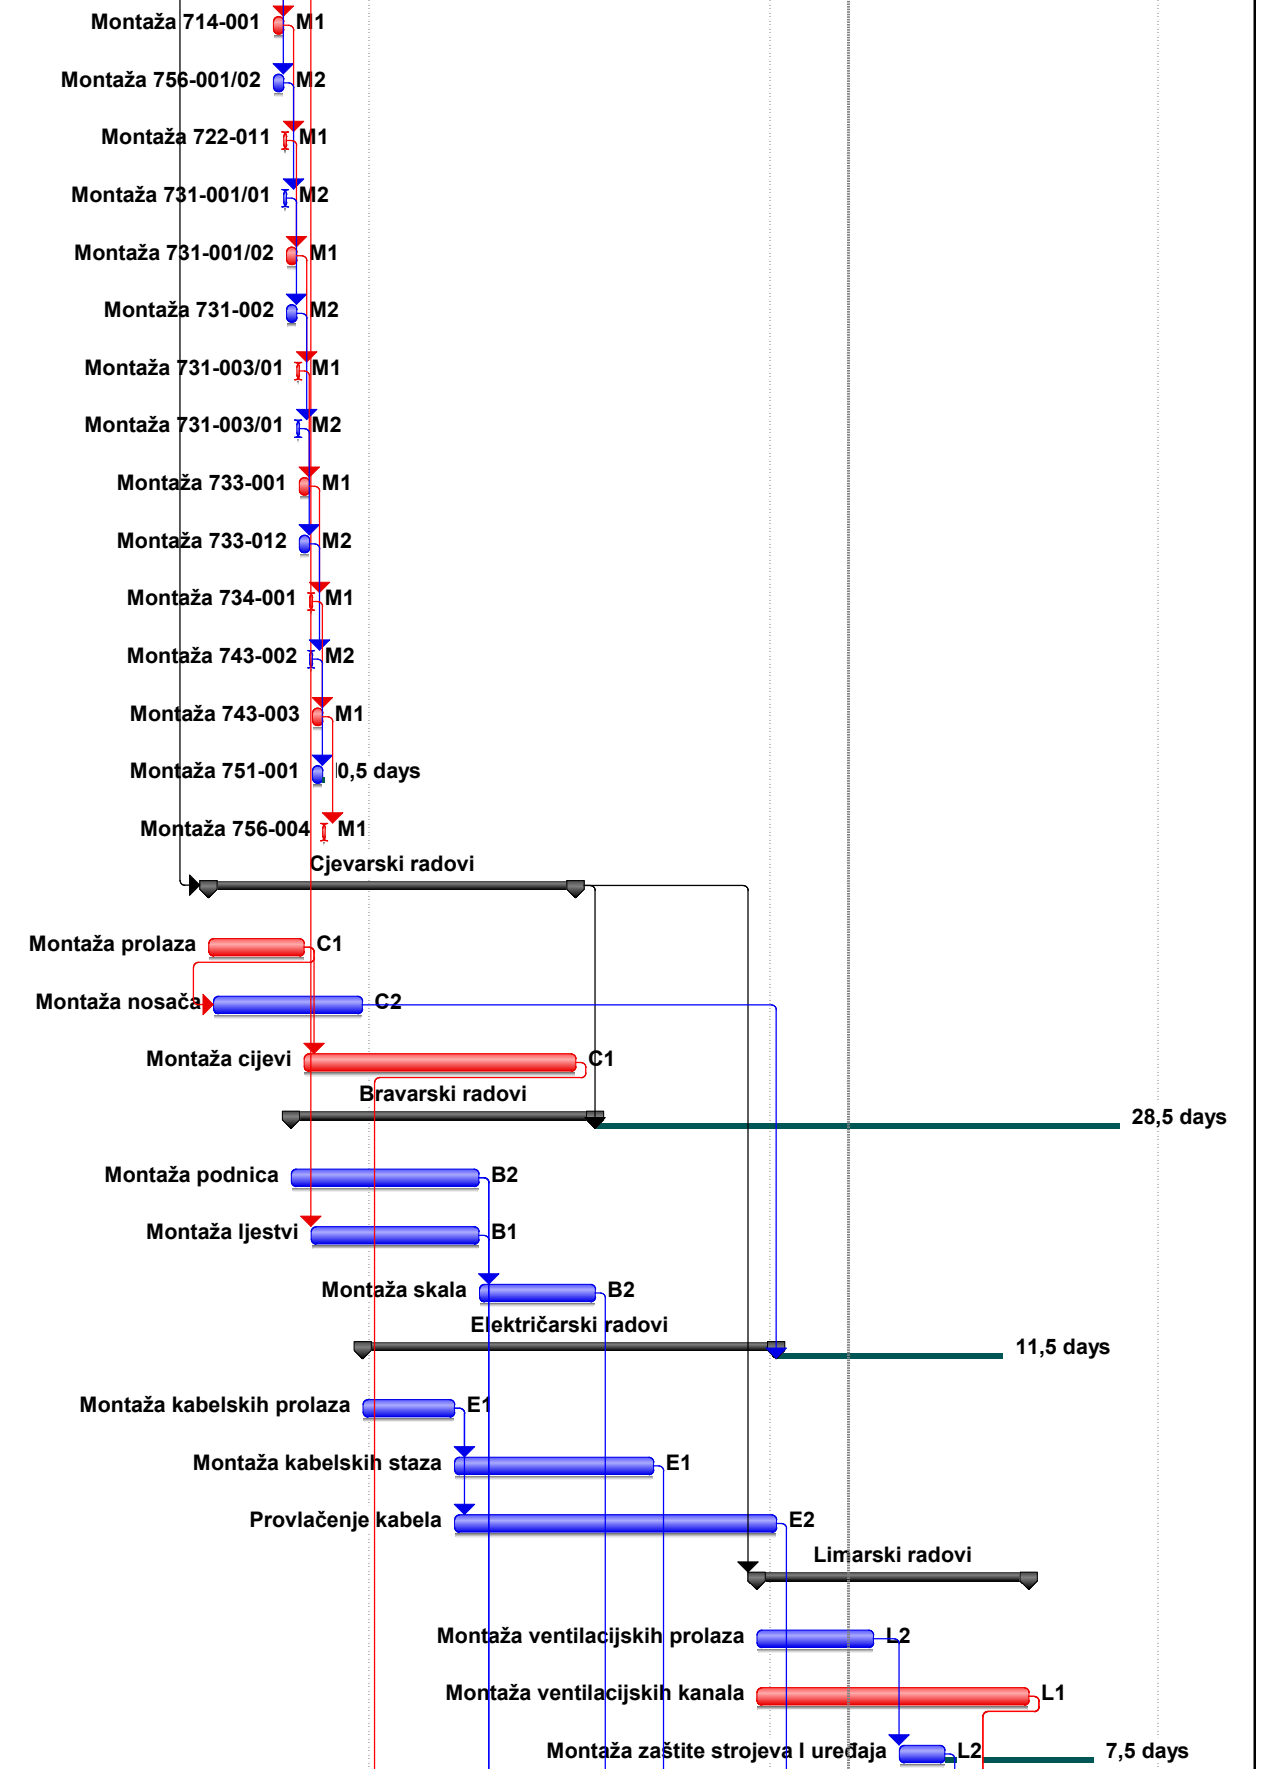

Project: OPREMANJE 2 PLATFORME  
Date: Thu 7.9.23

Critical		Split		Slack		Project Summary		External Tasks	
Critical Split		Progress		Slippage		Rolled Up Critical		External Milestone	
Task		Milestone		Summary		Rolled Up Critical		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Work	Resources	Jul '23							Aug '23							Sep '23							Oct '23				
									11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1									
94	<b>Izolaterski radovi</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 5.9.23</b>	<b>Mon 18.9.23</b>	<b>92FS-12 days</b>	<b>\$7.200,00</b>	<b>240 hrs</b>		Izolaterski radovi 3 days																									
95	Montaža izolacije	10 days	Tue 5.9.23	Mon 18.9.23		\$7.200,00	240 hrs	Izolateri (3)[300%]	Montaža izolacije I																									
96	<b>Ispitivanje</b>	<b>39 days</b>	<b>Thu 3.8.23</b>	<b>Tue 26.9.23</b>		<b>\$15.888,00</b>	<b>760 hrs</b>		Ispitivanje																									
97	<b>Ispitivanje cjevovoda</b>	<b>13,5 days</b>	<b>Thu 3.8.23</b>	<b>Tue 22.8.23</b>		<b>\$5.808,00</b>	<b>264 hrs</b>		Ispitivanje cjevovoda 24 days																									
98	Pregled strukture cjevovoda	7 days	Thu 3.8.23	Fri 11.8.23	81FS-10 days	\$2.464,00	112 hrs	Ispitivači/cjevari1 (2)[200%]	Pregled strukture cjevovoda I/C1																									
99	Tlačenje cjevovoda	6 days	Mon 14.8.23	Mon 21.8.23	98	\$2.112,00	96 hrs	Ispitivači/cjevari1 (2)[200%]	Tlačenje cjevovoda I/C1																									
100	Pregled funkcionalnosti cjevovoda	3,5 days	Thu 17.8.23	Tue 22.8.23	99SS+3 days	\$1.232,00	56 hrs	Ispitivači/cjevari2 (2)[200%]	Pregled funkcionalnosti cjevovoda I/C2 25 days																									
101	Ispitivanje rada strojeva I uređaja	1,5 days	Tue 22.8.23	Wed 23.8.23	100	\$288,00	24 hrs	Ispitivači/Mehaničari (1)[200%]	Ispitivanje rada strojeva I uređaja I/M 24 days																									
102	<b>Pregled bravarskih radova</b>	<b>8 days</b>	<b>Wed 9.8.23</b>	<b>Mon 21.8.23</b>		<b>\$640,00</b>	<b>64 hrs</b>		Pregled bravarskih radova 26,5 days																									
103	Pregled strukture podnica	2 days	Wed 9.8.23	Fri 11.8.23	83	\$320,00	32 hrs	Kontrolori/Bravari2 (1)[200%]	Pregled strukture podnica K/B2 34,5 days																									
104	Pregled strukture ljestvi	1 day	Wed 9.8.23	Thu 10.8.23	84	\$160,00	16 hrs	Kontrolori/Bravari1 (1)[200%]	Pregled strukture ljestvi K/B1 35,5 days																									
105	Pregled strukture skala	1 day	Fri 18.8.23	Mon 21.8.23	85	\$160,00	16 hrs	Kontrolori/Bravari2 (1)[200%]	Pregled strukture skala K/B2 28,5 days																									
106	<b>Ispitivanje električarskih radova</b>	<b>15,5 days</b>	<b>Wed 23.8.23</b>	<b>Wed 13.9.23</b>		<b>\$7.872,00</b>	<b>328 hrs</b>		Ispitivanje električarskih radova 9,5 days																									
107	Pregled strukture kablskih staza	3,5 days	Wed 23.8.23	Mon 28.8.23	88	\$1.344,00	56 hrs	Ispitivači/Električari1 (2)[200%]	Pregled strukture kablskih staza I/E1 14,5 days																									
108	Pregled montaže kabla	5 days	Fri 1.9.23	Fri 8.9.23	89	\$1.920,00	80 hrs	Ispitivači/Električari1 (2)[200%]	Pregled montaže kabla I/E1 14,5 days																									
109	Ispitivanje ožičenja kabla	7 days	Mon 28.8.23	Wed 6.9.23	107	\$2.688,00	112 hrs	Ispitivači/Električari2 (2)[200%]	Ispitivanje ožičenja kabla I/E2 11,5 days																									
110	Test ispitivanja pod naponom	5 days	Wed 6.9.23	Wed 13.9.23	109	\$1.920,00	80 hrs	Ispitivači/Električari2 (2)[200%]	Test ispitivanja pod naponom I/E2 11,5 days																									
111	<b>Ispitivanje limarskih radova</b>	<b>8,5 days</b>	<b>Thu 14.9.23</b>	<b>Tue 26.9.23</b>		<b>\$560,00</b>	<b>56 hrs</b>		Ispitivanje limarskih radova 7,5 days																									
112	Pregled strukture ventilacije	2 days	Tue 19.9.23	Wed 20.9.23	92FS-2 days	\$160,00	16 hrs	Kontrolori/Limari1 (1)	Pregled strukture ventilacije K/L1																									
113	Pregled funkcionalnosti ventilacije	4 days	Thu 21.9.23	Tue 26.9.23	112	\$320,00	32 hrs	Kontrolori/Limari1 (1)	Pregled funkcionalnosti ventilacije K/L1																									
114	Pregled strukture zaštite strojeva	1 day	Thu 14.9.23	Fri 15.9.23	93	\$80,00	8 hrs	Kontrolori/Limari2 (1)	Pregled strukture zaštite strojeva K/L2																									
115	<b>Ispitivanje izolaterskih radova</b>	<b>3 days</b>	<b>Tue 19.9.23</b>	<b>Thu 21.9.23</b>		<b>\$720,00</b>	<b>24 hrs</b>		Ispitivanje izolaterskih radova 3 days																									
116	Pregled montaže izolacije	3 days	Tue 19.9.23	Thu 21.9.23	95	\$720,00	24 hrs	Izolateri (3)	Pregled montaže izolacije I 3 days																									

Project: OPREMANJE 2 PLATFORME  
Date: Thu 7.9.23

- Critical Split Slack
- Critical Split Progress Slippage
- Task Milestone Summary
- Project Summary External Tasks
- Rolled Up Critical External Milestone
- Rolled Up Critical Deadline
